



Zweiter Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" in der Ortsgemeinde Bruchhausen

Übersicht über die durchgeführten Arbeiten bis 30.05.2023

Im Bereich linke Straßenseite (gerade Hausnummern) wurde von der "Grabenstraße" Richtung "Kirchstraße" der komplette Grabenaushub für Versorgungsleitungen hergestellt und folgende Leerrohre / Versorgungsleitungen verlegt:

- 1 Leerrohr für Beleuchtung
- 1 Leerrohr für Versorgungsleitungen Telekom
- 1 Leerrohr für Versorgungsleitungen BHAG - Strom
- 1 Erdverlegtes Kabel Telekom
- 1 Hauptleitung BHAG - Gas
- 1 Hauptleitung BHAG - Wasser

Diese Arbeiten sind komplett fertiggestellt.

Ab dem 13.02.2023 wurden im Kreuzungsbereich "Grabenstraße" Umbindungen für die Versorgungsleitungen Gas / Wasser / Telekom durchgeführt. Hierbei wurden die neu verlegten Versorgungsleitungen vorab auf die alten Versorgungsleitungen umgebunden. Diese Arbeiten wurden notwendig, um anschließend die Hausanschlüsse für Gas / Wasser / Telekom zu erneuern.

Im Rahmen der tiefbautechnischen Arbeiten für die Bad Honnef AG wurde u.a. im Kreuzungsbereich "Kolbergstraße" ein vorhandenes Schieberkreuz entfernt. Im Kreuzungsbereich "Siebengebirgsstraße" wurden neue Schieberkreuze für die Hauptgas- und Hauptwasserleitungen hergestellt. Die neu verlegten Versorgungsleitungen wurden an die neuen Schieberkreuze eingebunden. Im Bereich "Kirchstraße" bis "Auf der Held" wurden alle Hausanschlüsse Gas / Wasser (gerade / ungerade Hausnummern) in Absprache mit der Bad Honnef AG erneuert.

Alle Hausanschlüsse (gerade Hausnummern) der Telekom wurden an das neu verlegte Versorgungskabel angeschlossen. Diese Arbeiten sind komplett fertiggestellt.

Am 06.03.2023 wurde mit den Kanalbauarbeiten begonnen. Im Bereich Kreuzung "Siebengebirgsstraße" / "Kirchstraße" bis Kreuzung "Auf der Held" Höhe Haus 12/14 wurden die vorhandenen Mischwasserkanäle

Durchmesser DN 250 Stz, Länge ca. 40 m


Durchmesser DN 500 Stz, Länge ca. 43 m

gegen

Durchmesser DN 400 PP, Länge ca. 40 m

Durchmesser DN 700 PEHD, Länge ca. 43 m

in einer Tiefe bis ca. 3,00 m ausgetauscht. Alle Schachtbauwerke wurden erneuert.

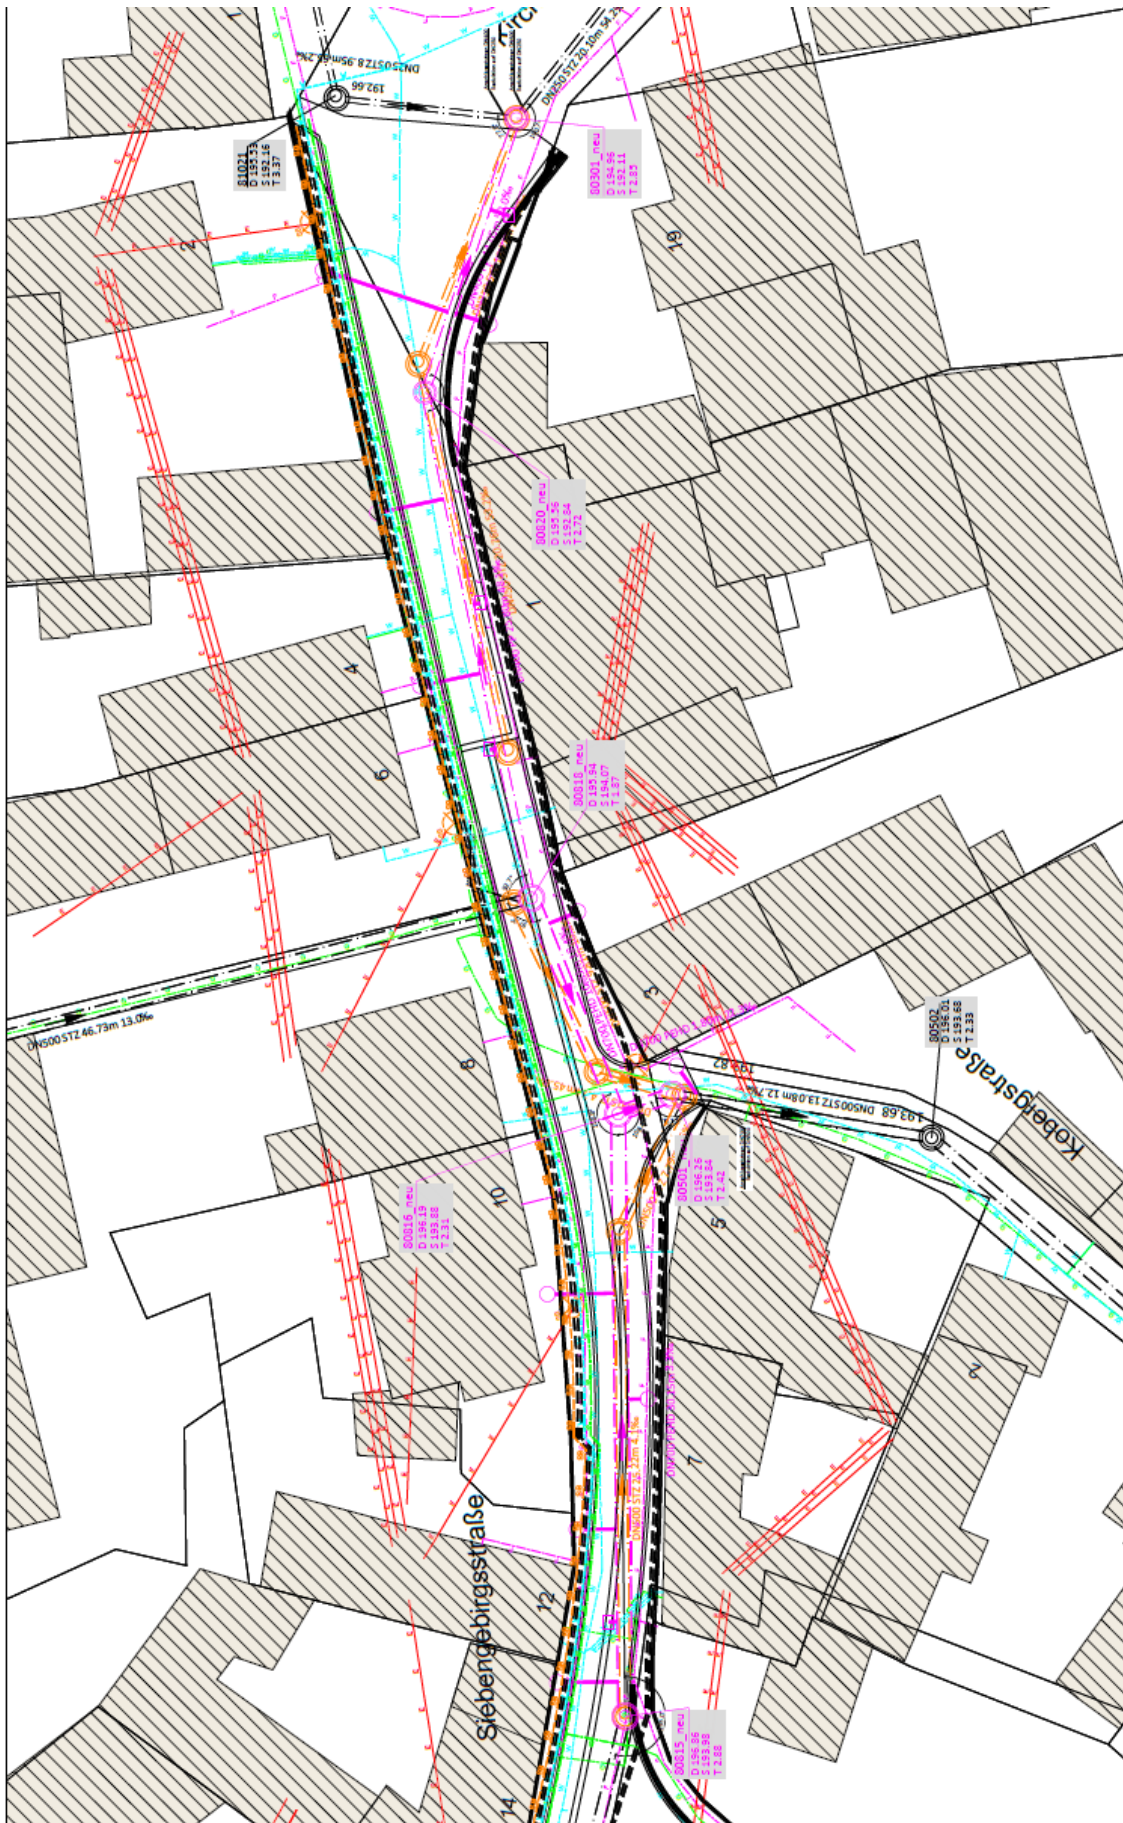

INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
BERATENDE INGENIEURE PARTG MBB





Alle Schmutzwasser- und Regenwasserhausanschlüsse im vorgenannten Ausbaubereich wurden mit Rohren Durchmesser DN 160 aus PP erneuert und an die neuen Kanalhaltungen angeschlossen.

Voraussichtlich ab dem 05.06.2023 wird mit der Erneuerung der Schmutzwasser-/ Regenwasserhausanschlüsse im Bereich "Grabenstraße" bis "Auf der Held" begonnen. Im Anschluss daran wird mit der Verlegung der Versorgungsleitungen auf der rechten Straßenseite (ungerade Hausnummern) begonnen.

Aufgestellt:
Bruchhausen, den 30.05.2023


Schmiedem

